Geschwindigkeitsmessung in: **Reichersdorf**

Messstelle bei: **Thambacher Straße, von Ortsmitte kommend**

Messzeitraum von - bis **15.09.2026** **bis** **22.10.2026**
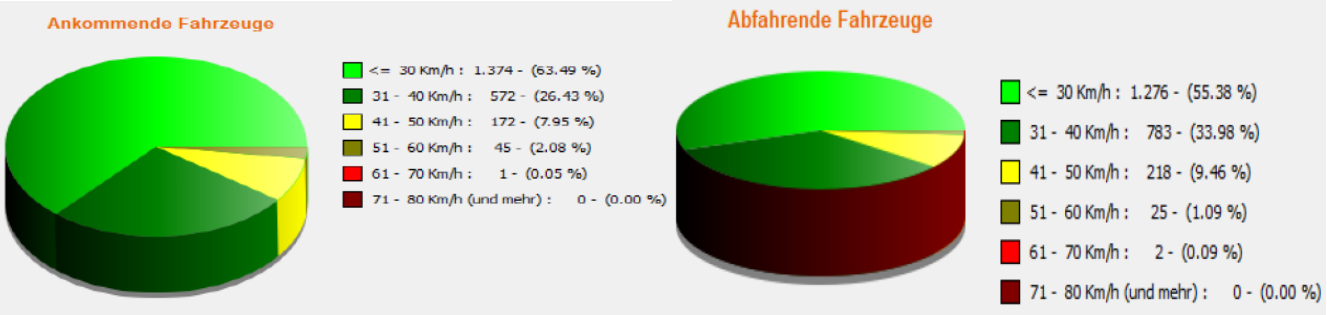
	Anzahl	Tempolimit	Anzahl	V85	Vmax
	Messtage	erlaubte Ge-schwindig-keit	Anzahl der Fahrzeuge	Bedeutet, dass 85 % der gemessenen Fahrzeuge diese Geschwindigkeit nicht überschritten haben.	Gibt die höchst gemessene Geschwindig-keit an. Es kann sich auch nur um ein einzelnes Fahrzeug handeln.
Messrichtung ankommende Fahrzeuge	38	30	2.164	37,0	63,0
Messrichtung abfahrende Fahrzeuge			2.304	38,0	67,0
Messergebnis gesamt<=>			**4.468**	**37,5**	**67,0**
